		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**1. Project Execution (62 days)**	**59 days?**	**1/10/24 8:00 AM**	**20/12/24 5:00 PM**	
2		**1.1 Project Initiation (3 days)**	**3 days?**	**1/10/24 8:00 AM**	**3/10/24 5:00 PM**	
3		1.1.1 Define Project Scope and Objecti...	1 day?	1/10/24 8:00 AM	1/10/24 5:00 PM	
4		1.1.2 Identify Stakeholders and Roles (...	1 day?	2/10/24 8:00 AM	2/10/24 5:00 PM	3
5		1.1.3 Develop Project Charter (1 day)	1 day?	3/10/24 8:00 AM	3/10/24 5:00 PM	4
6		**1.2 Requirement Analysis (3 days)**	**3 days?**	**4/10/24 8:00 AM**	**8/10/24 5:00 PM**	**2**
7		1.2.1 Gather Integration Requirements ...	1 day?	4/10/24 8:00 AM	4/10/24 5:00 PM	2
8		1.2.2 Define Data and Functionality Int...	1 day?	7/10/24 8:00 AM	7/10/24 5:00 PM	7
9		1.2.3 Identify Technical Dependencies ...	1 day?	8/10/24 8:00 AM	8/10/24 5:00 PM	8
10		**1.3 System Design (3 days)(more leve...**	**9 days?**	**4/10/24 8:00 AM**	**16/10/24 5:00 PM**	**2**
11		**1.3.1 Design Integrated Platform ...**	**4 days?**	**4/10/24 8:00 AM**	**9/10/24 5:00 PM**	
12		1.3.1.1 Define Data flow for Integr...	1 day?	4/10/24 8:00 AM	4/10/24 5:00 PM	2
13		1.3.1.2 Design communication proto..	1 day?	7/10/24 8:00 AM	7/10/24 5:00 PM	12
14		1.3.1.3 Identify Security Requireme...	1 day?	8/10/24 8:00 AM	8/10/24 5:00 PM	13
15		1.3.1.4 Develop Access Control Mec...	1 day?	9/10/24 8:00 AM	9/10/24 5:00 PM	14
16		**1.3.2 Integration Interface Design**	**4 days?**	**10/10/24 8:00 AM**	**15/10/24 5:00 PM**	
17		1.3.2.1 GMCI Integration Interface...	1 day?	10/10/24 8:00 AM	10/10/24 5:00 PM	15
18		1.3.2.2 Induk Integration Interface...	1 day?	11/10/24 8:00 AM	11/10/24 5:00 PM	17
19		1.3.2.3 OurVoice Integration Interf...	1 day?	14/10/24 8:00 AM	14/10/24 5:00 PM	18
20		1.3.2.4 Integration Interface Desig...	1 day?	15/10/24 8:00 AM	15/10/24 5:00 PM	19
21		**1.3.3 User Interface Design(Integr...**	**1 day?**	**16/10/24 8:00 AM**	**16/10/24 5:00 PM**	
22		1.3.3.1 Create User Interface Mock...	0.5 days?	16/10/24 8:00 AM	16/10/24 1:00 PM	20
23		1.3.3.2 Define User Experience	0.5 days?	16/10/24 1:00 PM	16/10/24 5:00 PM	22
24		**1.4 Development and Integration (26 ...**	**13 days?**	**17/10/24 8:00 AM**	**4/11/24 5:00 PM**	
25		**1.4.1 Develop Integration Interfac...**	**13 days?**	**17/10/24 8:00 AM**	**4/11/24 5:00 PM**	
26		**1.4.1.1 GMCI Integration (3 day..**	**3 days?**	**17/10/24 8:00 AM**	**21/10/24 5:00 PM**	
27		1.4.1.1.1 Set up GMCI integrati...	1 day?	17/10/24 8:00 AM	17/10/24 5:00 PM	23
28		1.4.1.1.2 Develop API for GMCI...	1 day?	18/10/24 8:00 AM	18/10/24 5:00 PM	27
29		1.4.1.1.3 Implement logic for se..	1 day?	21/10/24 8:00 AM	21/10/24 5:00 PM	28
30		**1.4.1.2 Induk Integration (3 da...**	**3 days?**	**22/10/24 8:00 AM**	**24/10/24 5:00 PM**	
31		1.4.1.2.1 Setup Induk integratio..	1 day?	22/10/24 8:00 AM	22/10/24 5:00 PM	29
32		1.4.1.2.2 Develop API for self di..	1 day?	23/10/24 8:00 AM	23/10/24 5:00 PM	31
33		1.4.1.2.3 Design content deliver..	1 day?	24/10/24 8:00 AM	24/10/24 5:00 PM	32
34		**1.4.1.3 OurVoice Integration (3 ..**	**3 days?**	**25/10/24 8:00 AM**	**29/10/24 5:00 PM**	
35		1.4.1.3.1 Set up OurVoice integ...	1 day?	25/10/24 8:00 AM	25/10/24 5:00 PM	33

Resource Names			3 Sep 23							10 Sep 23							17 Sep 23							24 Sep 23							1 Oct 23							8 Oct 23							15 Oct 23							22 Oct		
	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T

23
W T F S
29 Oct 23
S M T W T F S
5 Nov 23
S M T W T F S
12 Nov 23
S M T W T F S
19 Nov 23
S M T W T F S
26 Nov 23
S M T W T F S
3 Dec 23
S M T W T F S
10 Dec 23
S M T W T F S
17 Dec 23
S M T W T F S
24 Dec 2
S M T

3
31 Dec 23
7 Jan 24
14 Jan 24
21 Jan 24
28 Jan 24
4 Feb 24
11 Feb 24
18 Feb 24
25 Feb 24
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W

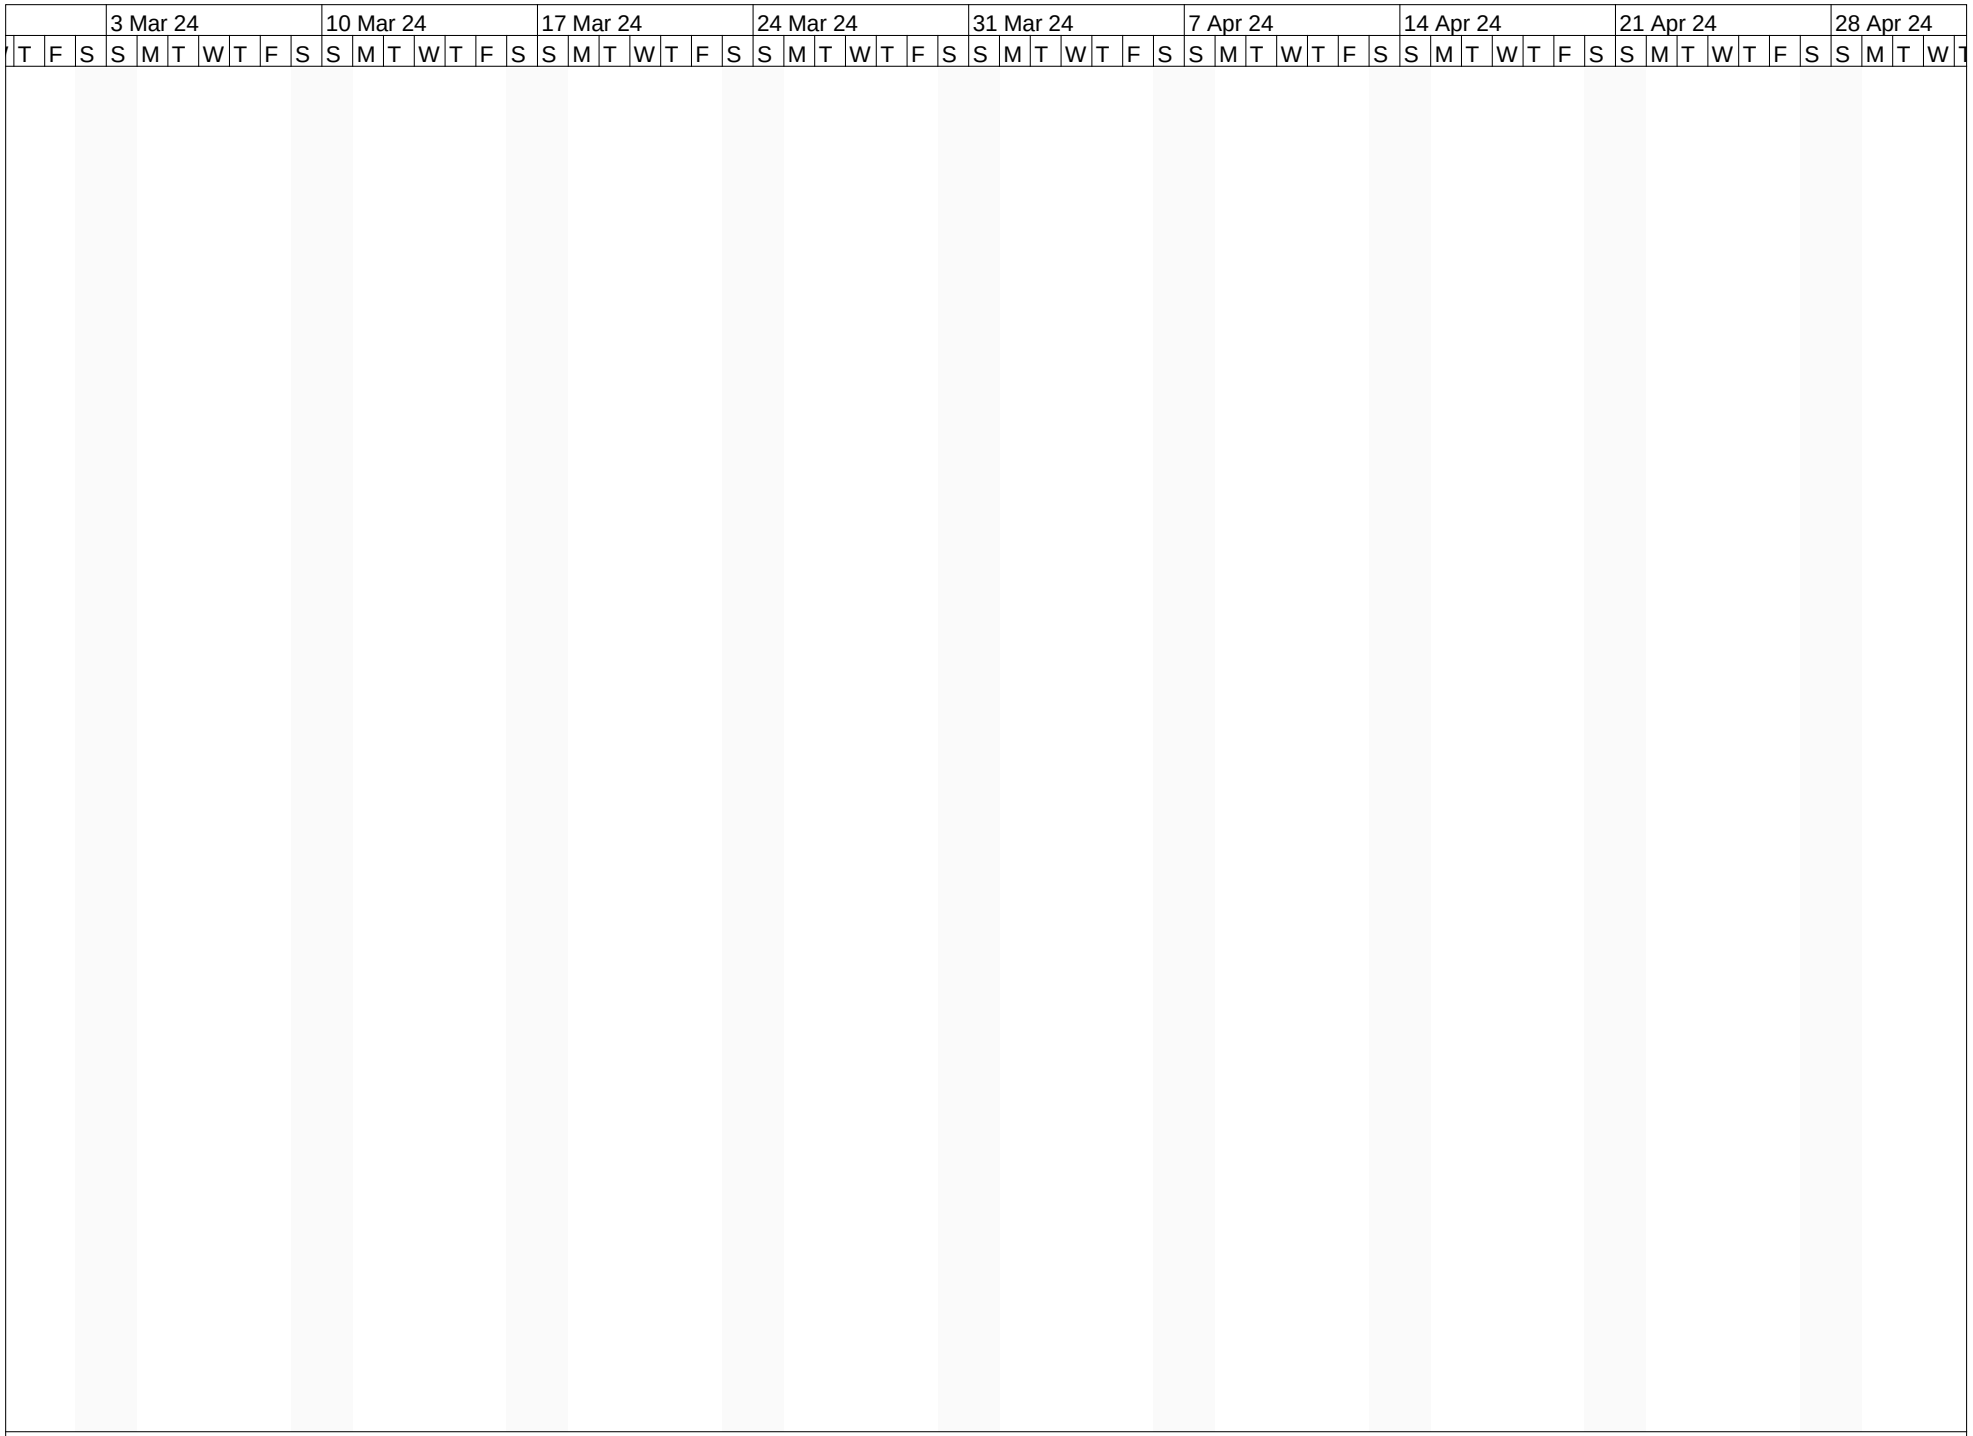
3 Mar 24
10 Mar 24
17 Mar 24
24 Mar 24
31 Mar 24
7 Apr 24
14 Apr 24
21 Apr 24
28 Apr 24
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T

5 May 24
12 May 24
19 May 24
26 May 24
2 Jun 24
9 Jun 24
16 Jun 24
23 Jun 24
30 Jun 24
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T

	7 Jul 24							14 Jul 24							21 Jul 24							28 Jul 24							4 Aug 24							11 Aug 24							18 Aug 24							25 Aug 24							1 Sep 24					
F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F

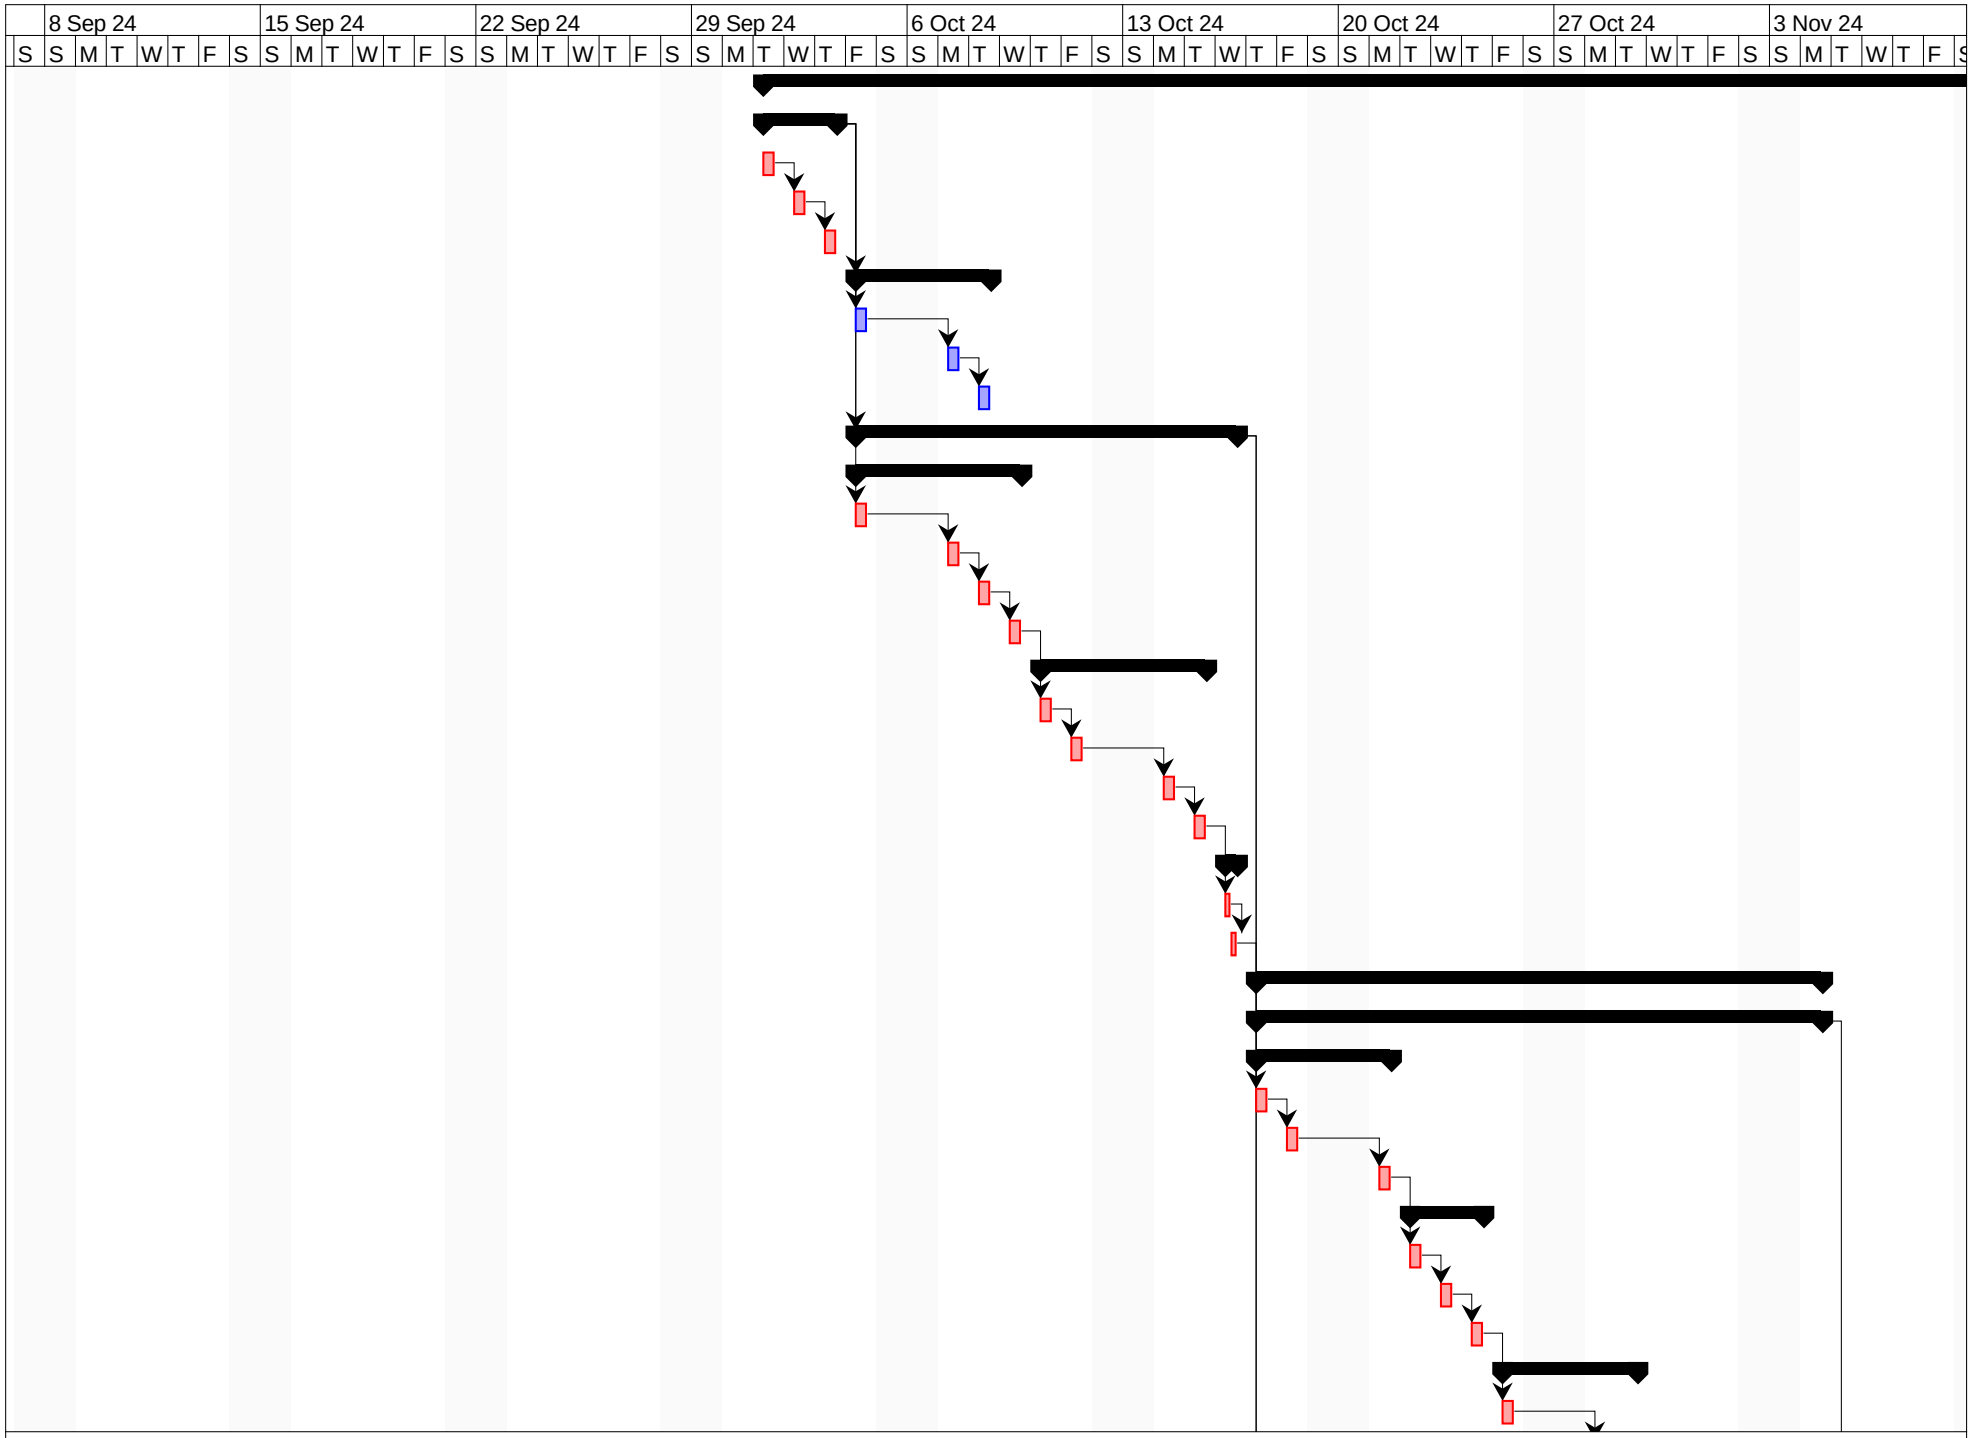
8 Sep 24
15 Sep 24
22 Sep 24
29 Sep 24
6 Oct 24
13 Oct 24
20 Oct 24
27 Oct 24
3 Nov 24
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

10 Nov 24
17 Nov 24
24 Nov 24
1 Dec 24
8 Dec 24
15 Dec 24
22 Dec 24
29 Dec 24
5 Jan 25
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

12 Jan 25							19
S	M	T	W	T	F	S	S

FIT2002WBSProject4 ...

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
36		1.4.1.3.2 Develop API for safe ...	1 day?	28/10/24 8:00 AM	28/10/24 5:00 PM	35
37		1.4.1.3.3 Implement moderation.	1 day?	29/10/24 8:00 AM	29/10/24 5:00 PM	36
38		1.4.1.4 Integration Interface Testin...	4 days?	30/10/24 8:00 AM	4/11/24 5:00 PM	37
39		1.4.2 Implement Single SignOn (SSO) S...	2 days?	17/10/24 8:00 AM	18/10/24 5:00 PM	10
40		1.4.3 Integrate with Monash Mental He...	2 days?	17/10/24 8:00 AM	18/10/24 5:00 PM	10
41		**1.5 Testing and Quality Assurance (9 d...**	**9 days?**	**5/11/24 8:00 AM**	**15/11/24 5:00 PM**	**25;39;40**
42		1.5.1 Unit Testing of Integration Compo...	3 days?	5/11/24 8:00 AM	7/11/24 5:00 PM	40
43		1.5.2 System Integration Testing (3 days)	3 days?	8/11/24 8:00 AM	12/11/24 5:00 PM	42
44		1.5.3 Security and Privacy Testing (2 d...	2 days?	13/11/24 8:00 AM	14/11/24 5:00 PM	43
45		1.5.4 User Acceptance Testing (1 day)	1 day?	15/11/24 8:00 AM	15/11/24 5:00 PM	44
46		**1.6 Documentation and Training (6 da...**	**6 days?**	**18/11/24 8:00 AM**	**25/11/24 5:00 PM**	**41**
47		1.6.1 Create User Manuals for Integrat...	3 days?	18/11/24 8:00 AM	20/11/24 5:00 PM	45
48		1.6.2 Develop Technical Documentation...	2 days?	21/11/24 8:00 AM	22/11/24 5:00 PM	47
49		1.6.3 Provide Training for Administrator...	1 day?	25/11/24 8:00 AM	25/11/24 5:00 PM	48
50		**1.7 Deployment and Rollout (8 days)**	**8 days?**	**26/11/24 8:00 AM**	**5/12/24 5:00 PM**	**41;46**
51		1.7.1 Plan Rollout Strategy (2 days)	2 days?	26/11/24 8:00 AM	27/11/24 5:00 PM	49
52		1.7.2 Execute Rollout of Integrated Pla...	4 days?	28/11/24 8:00 AM	3/12/24 5:00 PM	51
53		1.7.3 Monitor Initial Platform Performan...	2 days?	4/12/24 8:00 AM	5/12/24 5:00 PM	52
54		**1.8 Project Closure (4 days)**	**4 days?**	**6/12/24 8:00 AM**	**11/12/24 5:00 PM**	**50**
55		1.8.1 Confirm Alignment with Initial Obj...	2 days?	6/12/24 8:00 AM	9/12/24 5:00 PM	53
56		1.8.2 Handover Integrated Platform to ...	2 days?	10/12/24 8:00 AM	11/12/24 5:00 PM	55
57		**1.9 Buffer Days and Contingency (5 da...**	**5 days?**	**12/12/24 8:00 AM**	**18/12/24 5:00 PM**	
58		1.9.1 Buffer Days and Contingency (5 d...	5 days?	12/12/24 8:00 AM	18/12/24 5:00 PM	56
59		**1.10 Final Review and Close (2 days)**	**2 days?**	**19/12/24 8:00 AM**	**20/12/24 5:00 PM**	
60		1.10.1 Final Review and Documentation...	2 days?	19/12/24 8:00 AM	20/12/24 5:00 PM	58

Resource Names			3 Sep 23							10 Sep 23							17 Sep 23							24 Sep 23							1 Oct 23							8 Oct 23							15 Oct 23							22 Oct		
	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T

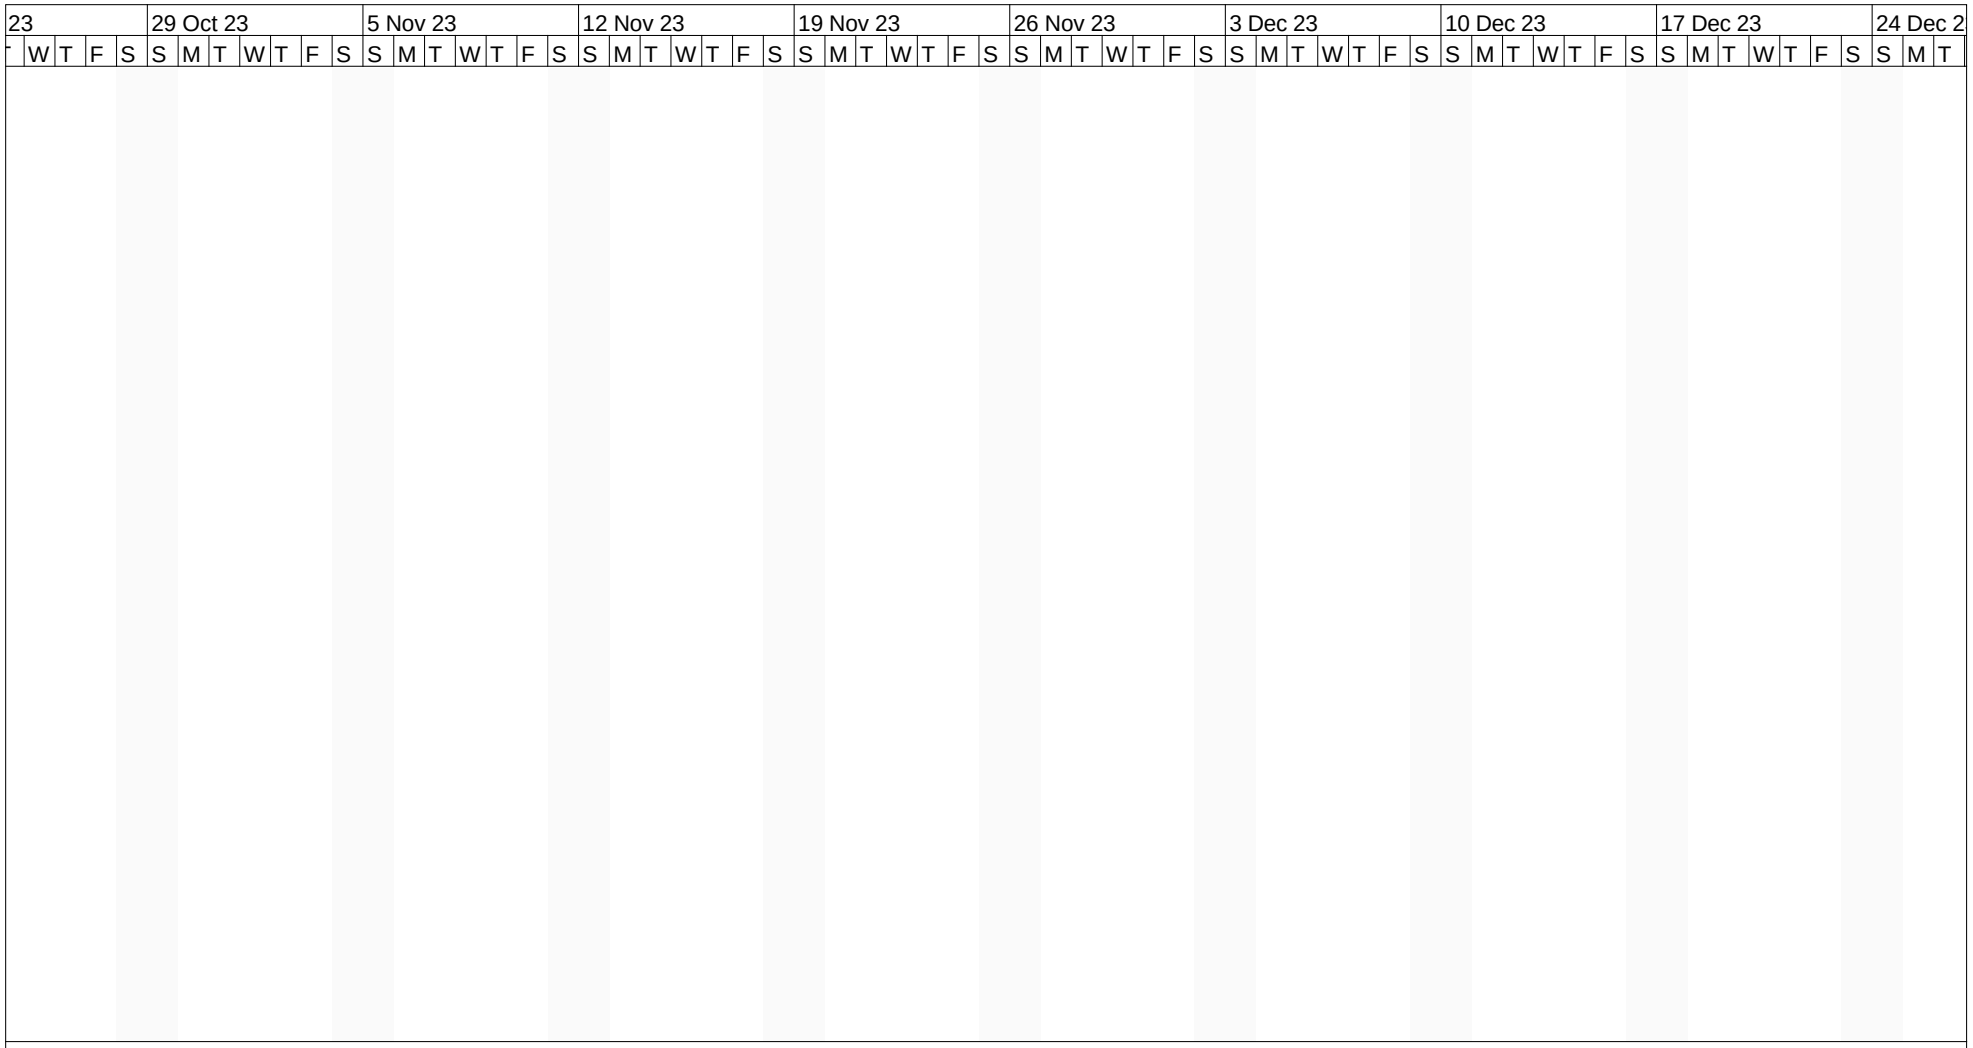
23
29 Oct 23
5 Nov 23
12 Nov 23
19 Nov 23
26 Nov 23
3 Dec 23
10 Dec 23
17 Dec 23
24 Dec 2
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

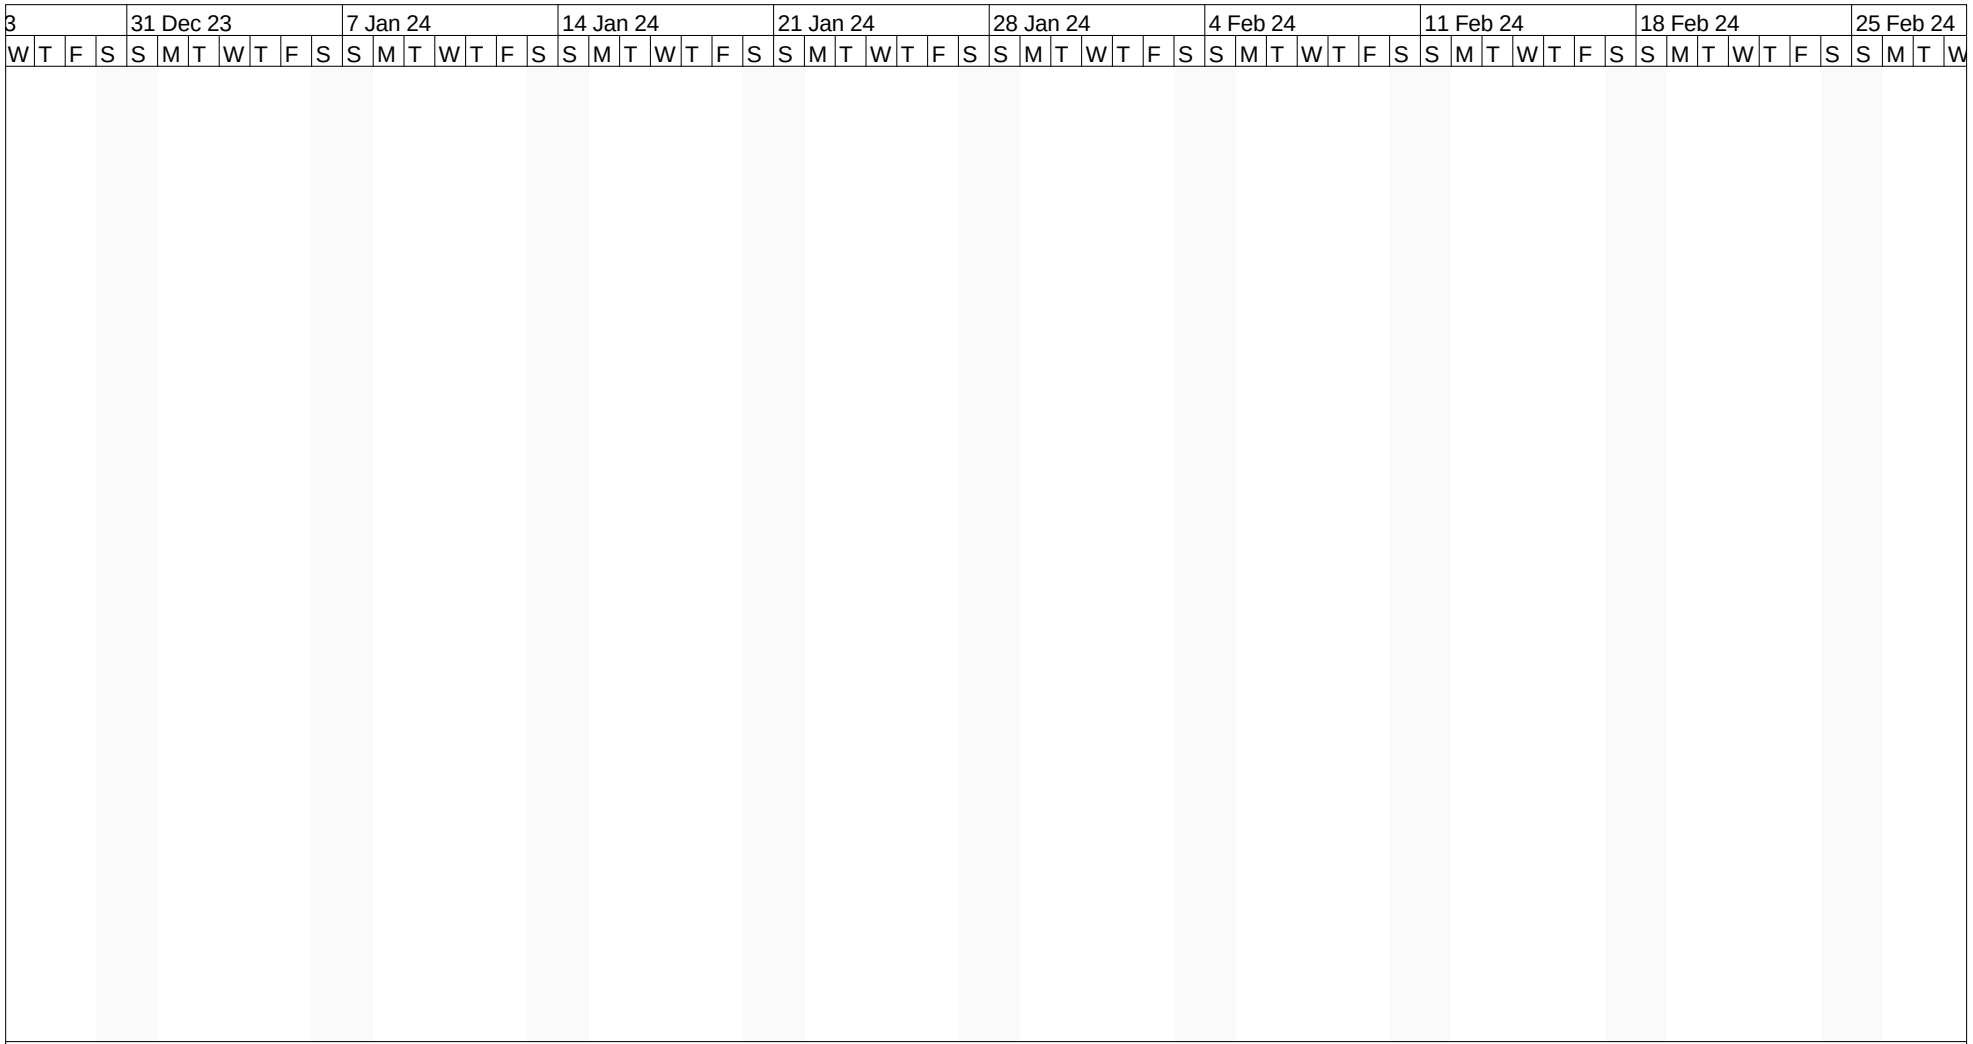
3
31 Dec 23
7 Jan 24
14 Jan 24
21 Jan 24
28 Jan 24
4 Feb 24
11 Feb 24
18 Feb 24
25 Feb 24
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W

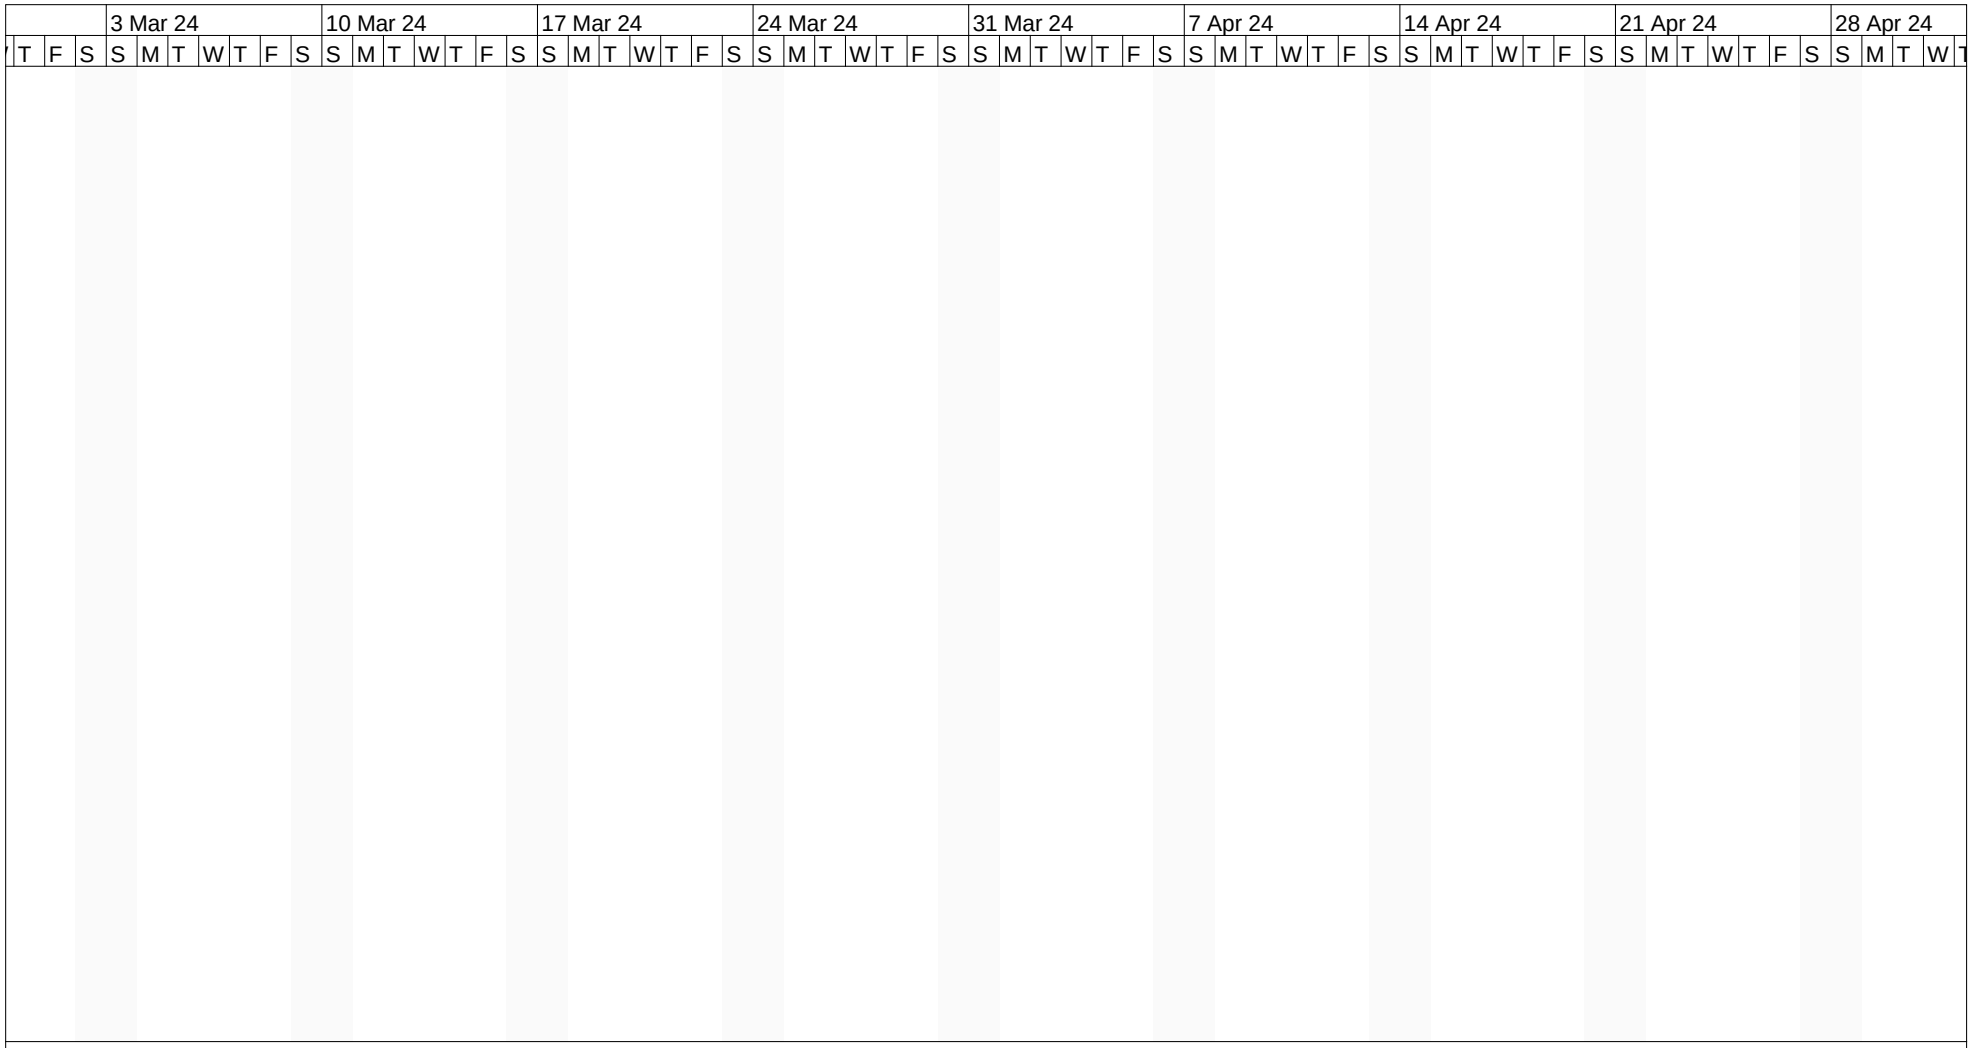
3 Mar 24
10 Mar 24
17 Mar 24
24 Mar 24
31 Mar 24
7 Apr 24
14 Apr 24
21 Apr 24
28 Apr 24
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T

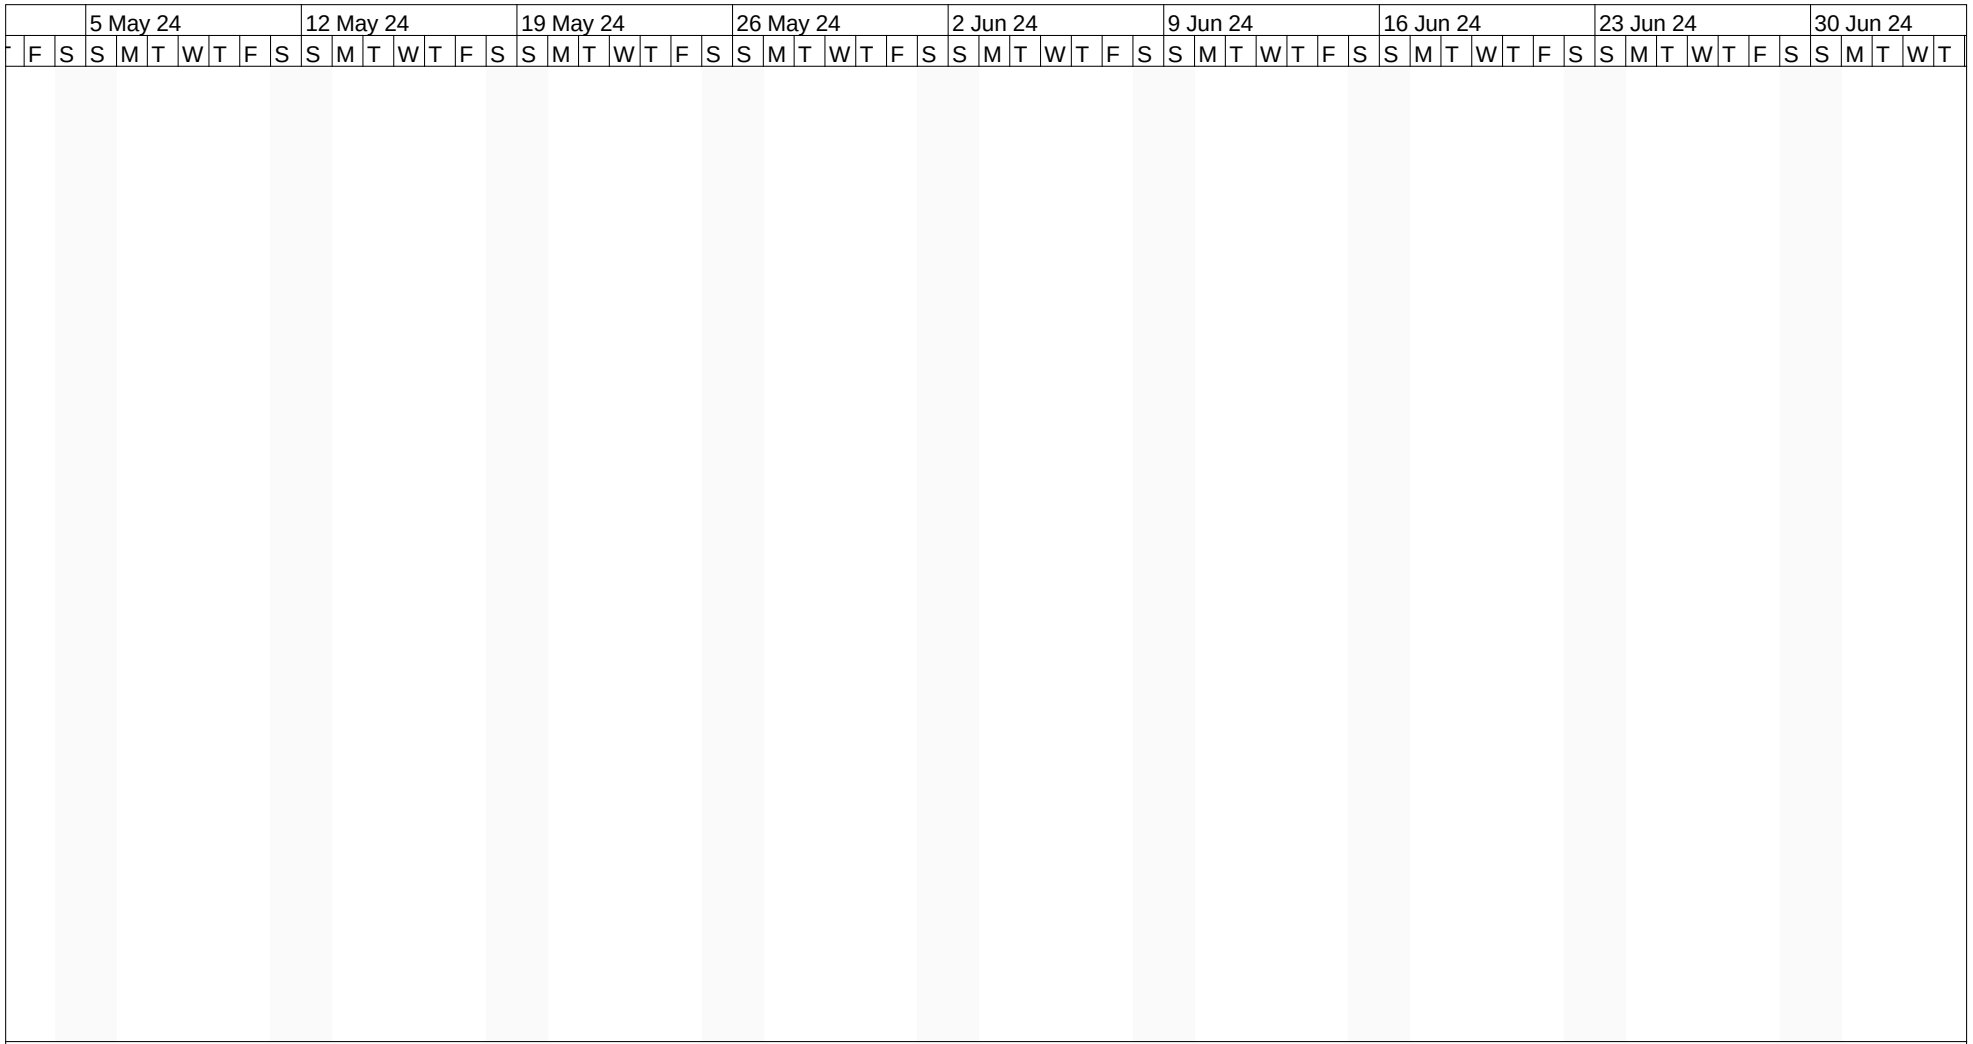
5 May 24
12 May 24
19 May 24
26 May 24
2 Jun 24
9 Jun 24
16 Jun 24
23 Jun 24
30 Jun 24
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T

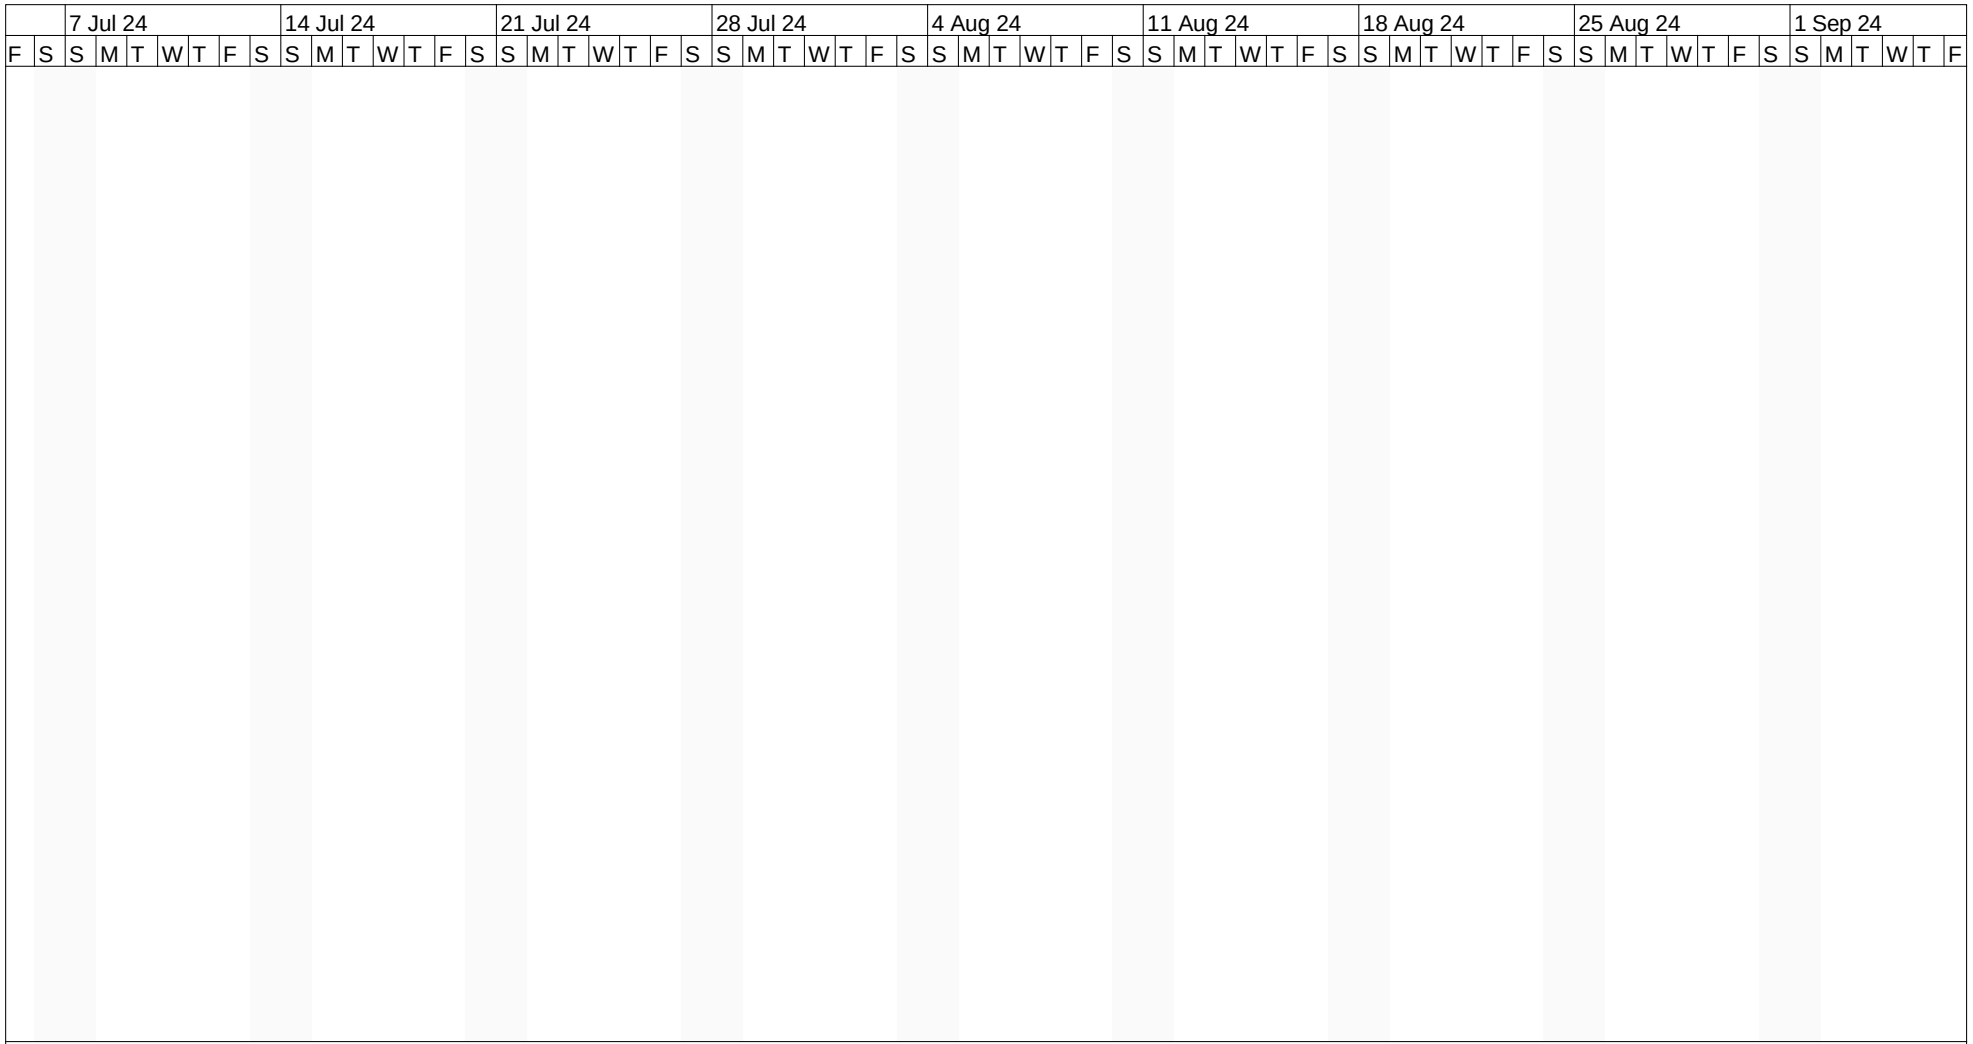
7 Jul 24
14 Jul 24
21 Jul 24
28 Jul 24
4 Aug 24
11 Aug 24
18 Aug 24
25 Aug 24
1 Sep 24
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F

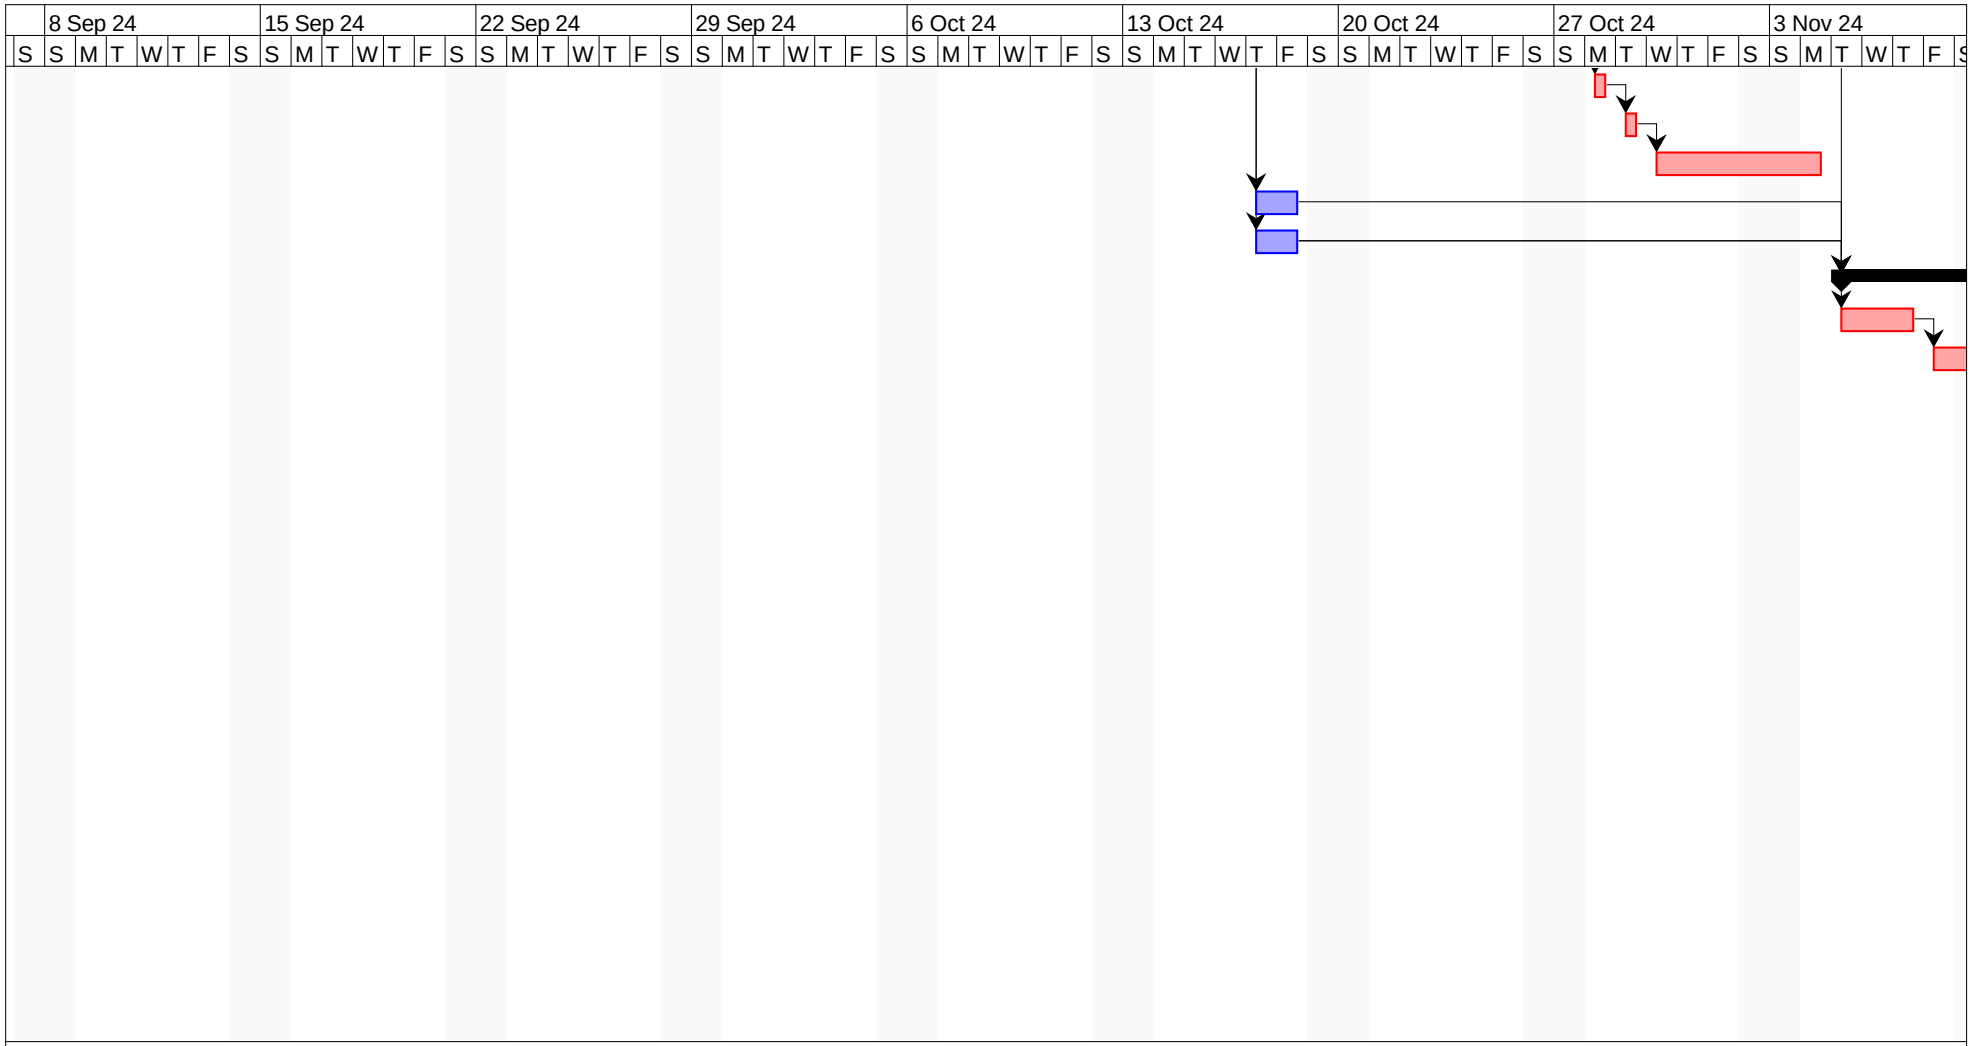
8 Sep 24
15 Sep 24
22 Sep 24
29 Sep 24
6 Oct 24
13 Oct 24
20 Oct 24
27 Oct 24
3 Nov 24
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

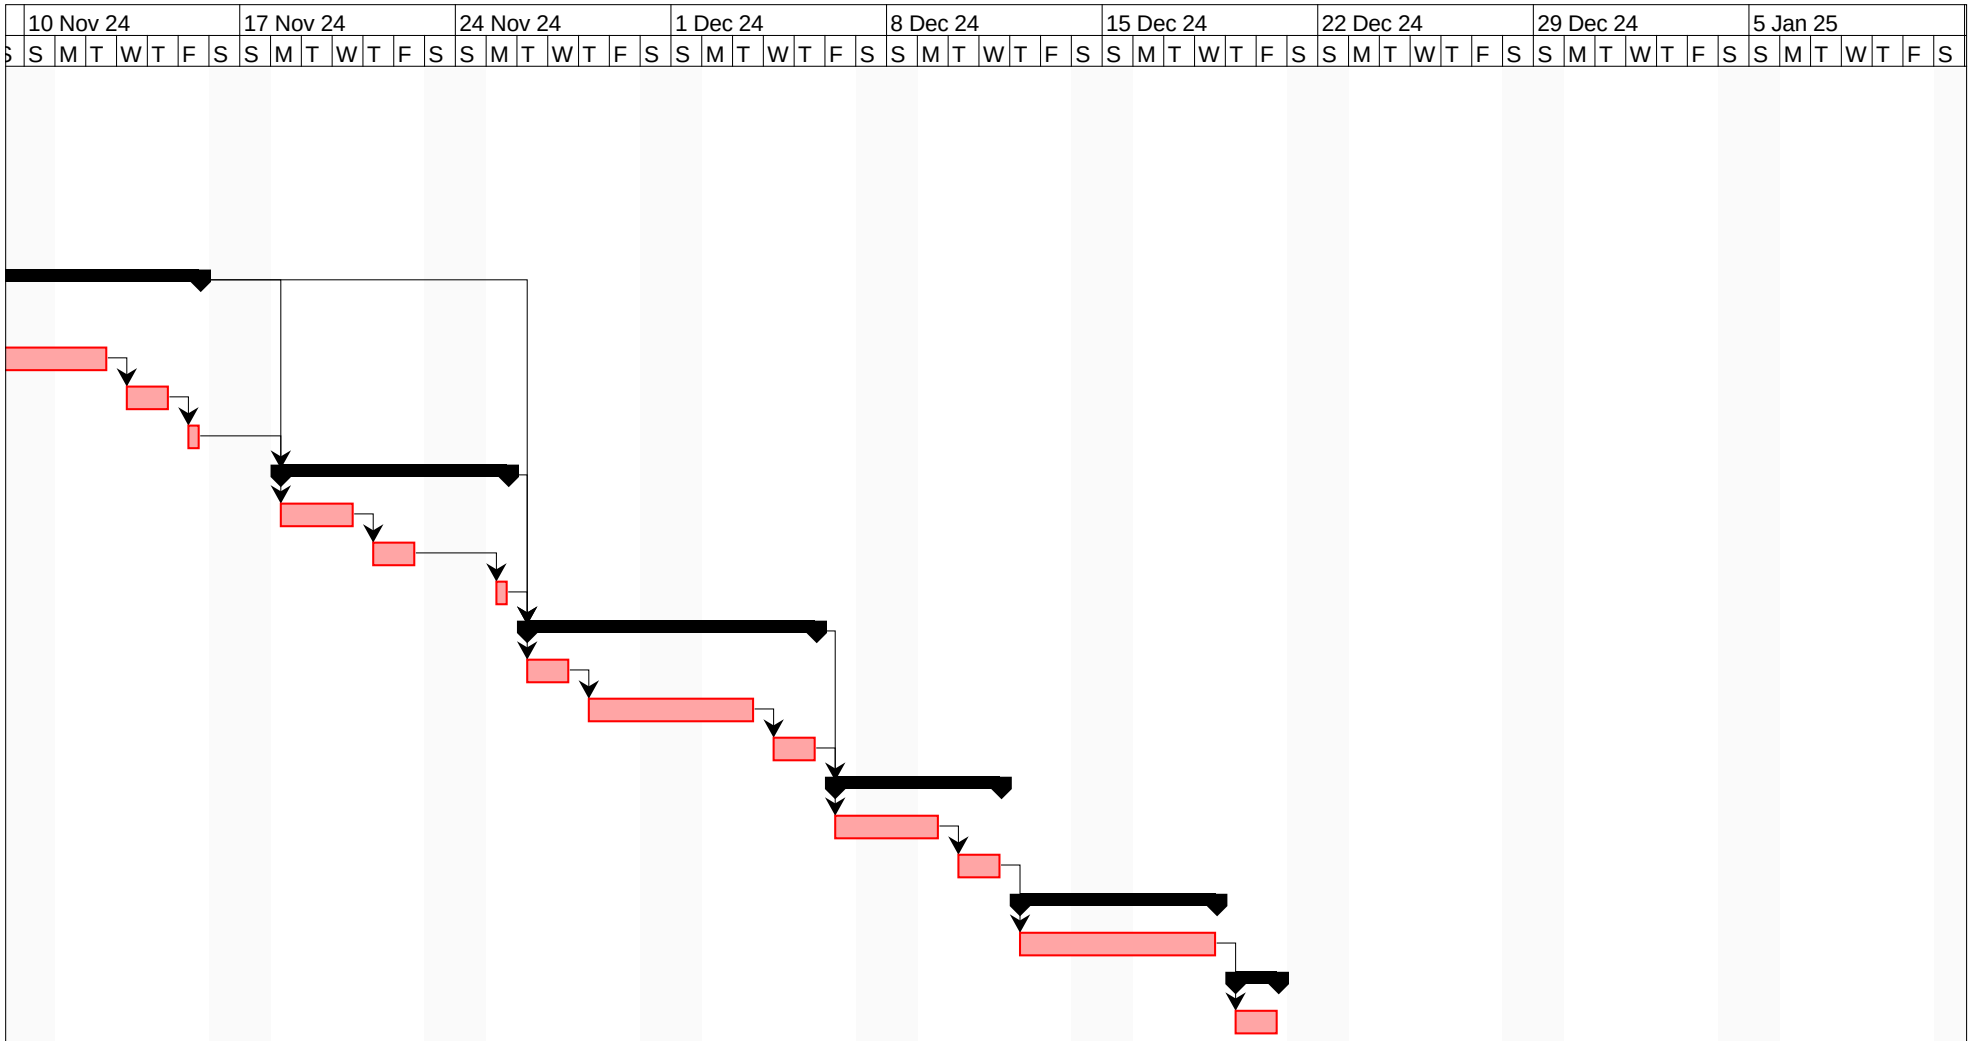
10 Nov 24
17 Nov 24
24 Nov 24
1 Dec 24
8 Dec 24
15 Dec 24
22 Dec 24
29 Dec 24
5 Jan 25
S M T W T F S


12 Jan 25
19
S M T W T F S S
FIT2002WBSProject4 ...
